KLATKA SCHODOWA KL 10-15

ZESTAWIENIE FIGUR

F1

F1a #12 – 68 szt.
L = 4450

F1b #8 – 94 szt.
L = 4450

F1c #16 – 19 szt.
L = 4450



F1d #20 – 5 szt.
L = 4850

F12a #8 – 44 szt.
L = 1640



F2

F2a #20 – 2 szt.
L = 6450



F3

F3a #12 – 88 szt.
L = 2000



F5

F5a #12 – 44 szt.
L = 2180

F5b #12 – 58 szt.
L = 1750

F5c #10 – 44 szt.
L = 4350



F6

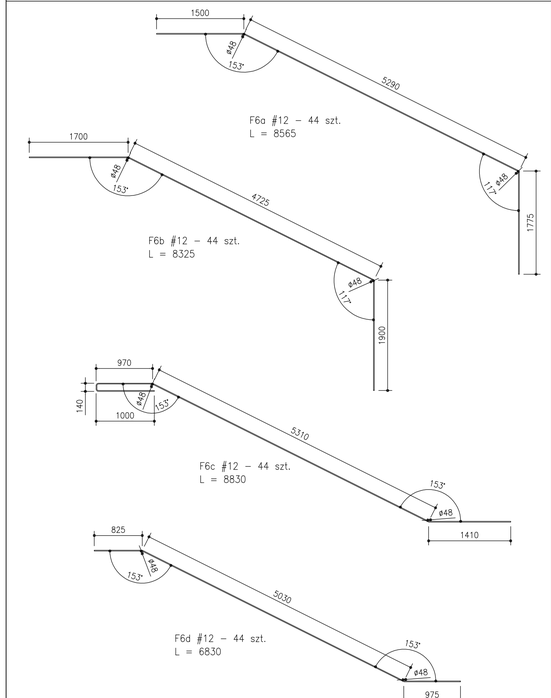

A-A

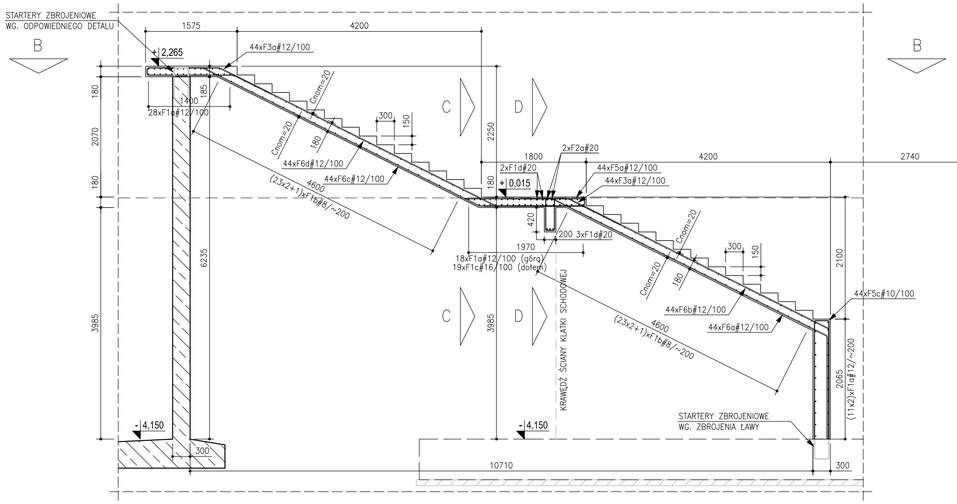

B-B

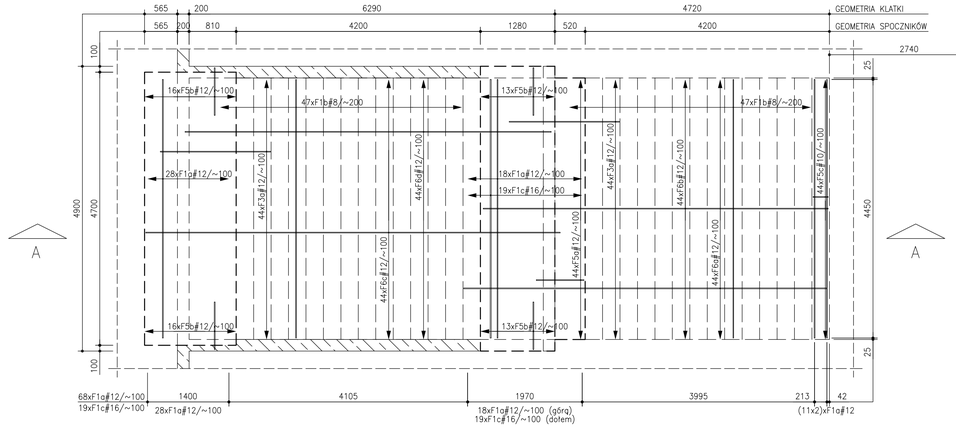

C-C



D-D



15

Data utworzenia: 2017-02-23	Numer projektu
Rewizja:	60515

NAZWA ELEMENTU :	KLATKA KL: 10 - 15.	RYSUNEK NR
ILOŚĆ ELEMENTÓW :	6 Szt.	60515/401

TABELA ZMIAN	Rewizja	Data	Opis zmiany

STAL ZBROJENIOWA

Nr pręta	Ilość [szt]	ø [mm]	Długość [mm]	Stal	Masa jedn. [kg]	Masa 1 szt. [kg]	Masa Całkowita dla średnicy [kg] # 6	# 8	# 10	# 12	# 16	# 20	# 25	# 32
F1a	68	12	4450	B500B	0,888	3,952				268,71				
F1b	94	8	4450	B500B	0,395	1,758		165,23						
F1c	19	16	4450	B500B	1,58	7,031					133,59			
F1d	5	20	4850	B500B	2,47	11,980						59,90		
F2a	2	20	6450	B500B	2,47	15,932						31,86		
F3a	88	12	2000	B500B	0,888	1,776				156,29				
F5a	44	12	2180	B500B	0,888	1,936				85,18				
F5b	58	12	1750	B500B	0,888	1,554				90,13				
F5c	44	10	4350	B500B	0,617	2,684				118,09				
F6a	44	12	8565	B500B	0,888	7,606				334,65				
F6b	44	12	8325	B500B	0,888	7,393				325,27				
F5c	44	12	8830	B500B	0,888	7,841				345,01				
F6d	44	12	6830	B500B	0,888	6,065				266,86				
F12a	44	8	1640	B500B	0,395	0,648		28,50						
RAZEM wg średnic [kg]							0,0	193,7	118,1	1872,1	133,6	91,8	0,0	0,0
RAZEM dla elementu [kg]							2409,3							
Masa dla elementów w ilości 6 sztuk							14455,6							

UWAGI:

01. WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
02. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH POZIOMÓW ORAZ BRANŻ.
03. ZBROJENIE SPOCZNIKÓW DOWIĄZAĆ DO ZBROJENIA ŚCIAN.
04. GRUNT POD FUNDAMENTEM POWINIEN ZOSTAĆ ODEBRANY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.
05. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH OD TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PILNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

"0,00" = 177,45 m n.p.m.

BETON PODSTAWOWY:
BIEGI: C30/37 (B37)
SPOCZNIKI: C30/37 (B37)
Cnom=20mm

KLASA ŚRODOWISKA:
STOPY FUND.: XC4.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA:
R60 (1 GODZ.)

STAL ZBROJENIOWA:
B500B lub równoważna.

Nazwa inwestycji i adres:

Budowa stadionu piłkarskiego
(na terenie istniejącego stadionu)
przy ulicy Struga w Radomiu

część działki nr ewid. 78 przy ul.Andrzeja Struga / 11 Listopada
i część działki nr ewid. 81 przy ul. Stanisława Zbrowskiego

Inwestor

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 9, 26-600 Radom

Projektant

ROSA-BUD S.A.
26-600 RADOM, ul. Orzeszowa 5/7,
tel.(0 48) 383 51 50, fax:(0 48) 384 63 00
www.rosabud.pl email: rosabud@rosabud.pl

WOJCIECH GĘSSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 RADOM, ul. Orzeszowa 22
tel. (048) 384 55 95, (48) 363 30 13, www.wgstudio.pl
e-mail: wgstudio@wgstudio.pl fax:(048) 384 55 96

Wszelkie prawa autorskie, które z przepisów chronią, a w szczególności prawo autorskie i prawa pokrewne, przysługują autorowi projektu. Bez jego zgody nie wolno kopiować, rozpowszechniać, przekazywać osobom trzecim ani wykorzystywać w celach innych niż te, dla których projekt został wykonany.

Branża: KONSTRUKCJA — Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant	mgr inż. Norbert Wysocki	Nr uprawnień	SWK/0066/POOK/08
Zespół projektowy	tech. Mariusz Tymoszuk inż. Mateusz Prokop mgr inż. Jakub Dańszewski mgr inż. Piotr Orłowski		
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Łęgowski		MAZ/0008/POOK/06

Treść rysunku:
RYSUNEK PRODUKCYJNY KLATEK SCHODOWYCH.
KL: 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Data	Skala
LUTY 2017	1:50

Nr projektu	Data Rewizji	Nr tomu	Nr rysunku
P-628		III	60515/401
